

Réunion publique d'information

TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT

Place Aristide Briand ➔ rue de Verdun

02600 Villers-Cotterêts



- ☐ Principaux acteurs
- ☐ Présentation du chantier
- ☐ Phase 1
- ☐ Phase 2
- ☐ Phase 3
- ☐ Plan de circulation piétonne
- ☐ Informations complémentaires

Sommaire

- Maître d'ouvrage : Communauté de Communes Retz-en-Valois



- Maître d'œuvre : ICAPE




- Entreprise : Eiffage Route
Conducteur de travaux :
Olivier MOULIN
Chef de chantier:
Tony GONCALVES




Les principaux acteurs

Phase 1

- 11 ml de canalisation à remplacer à hauteur du 1 place du Dr Moufflier
- 2 jours du 30/09 au 01/10/2019

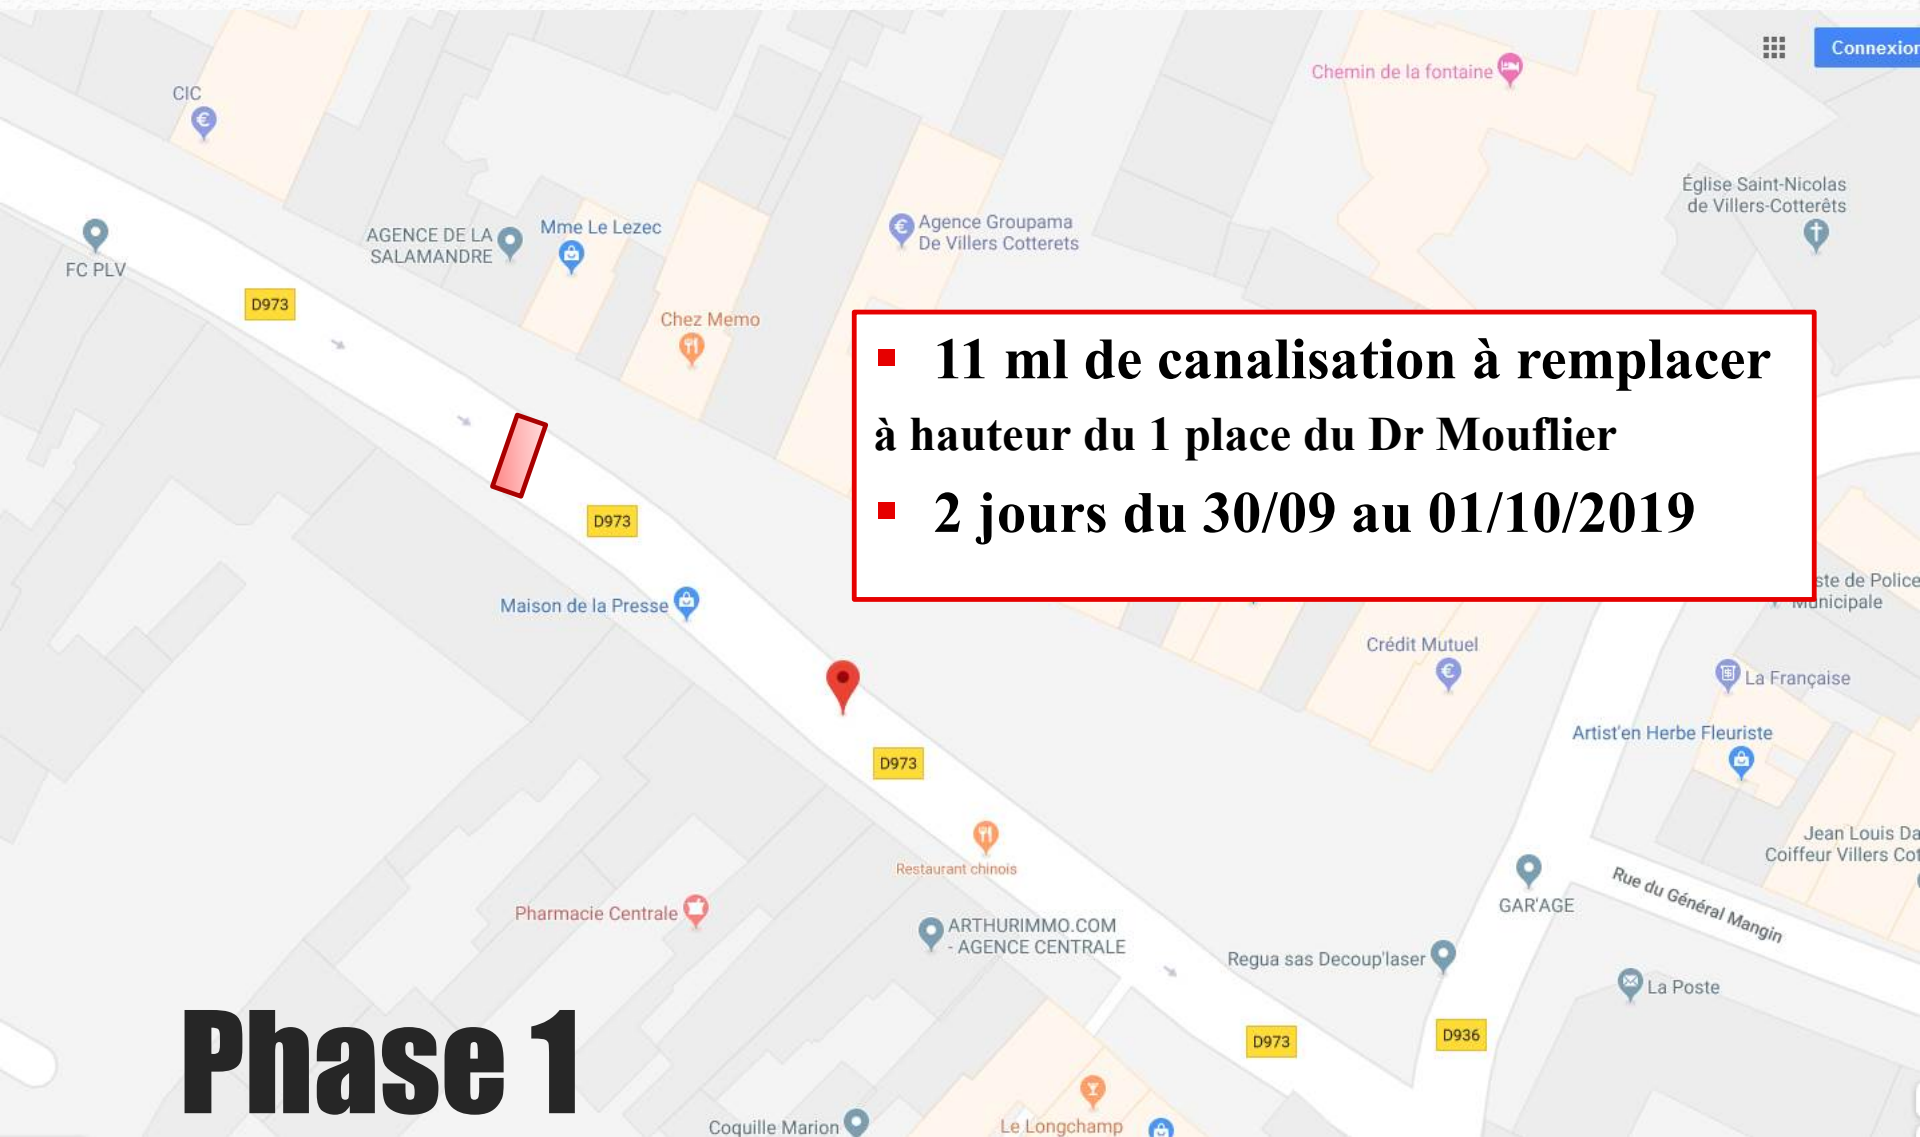

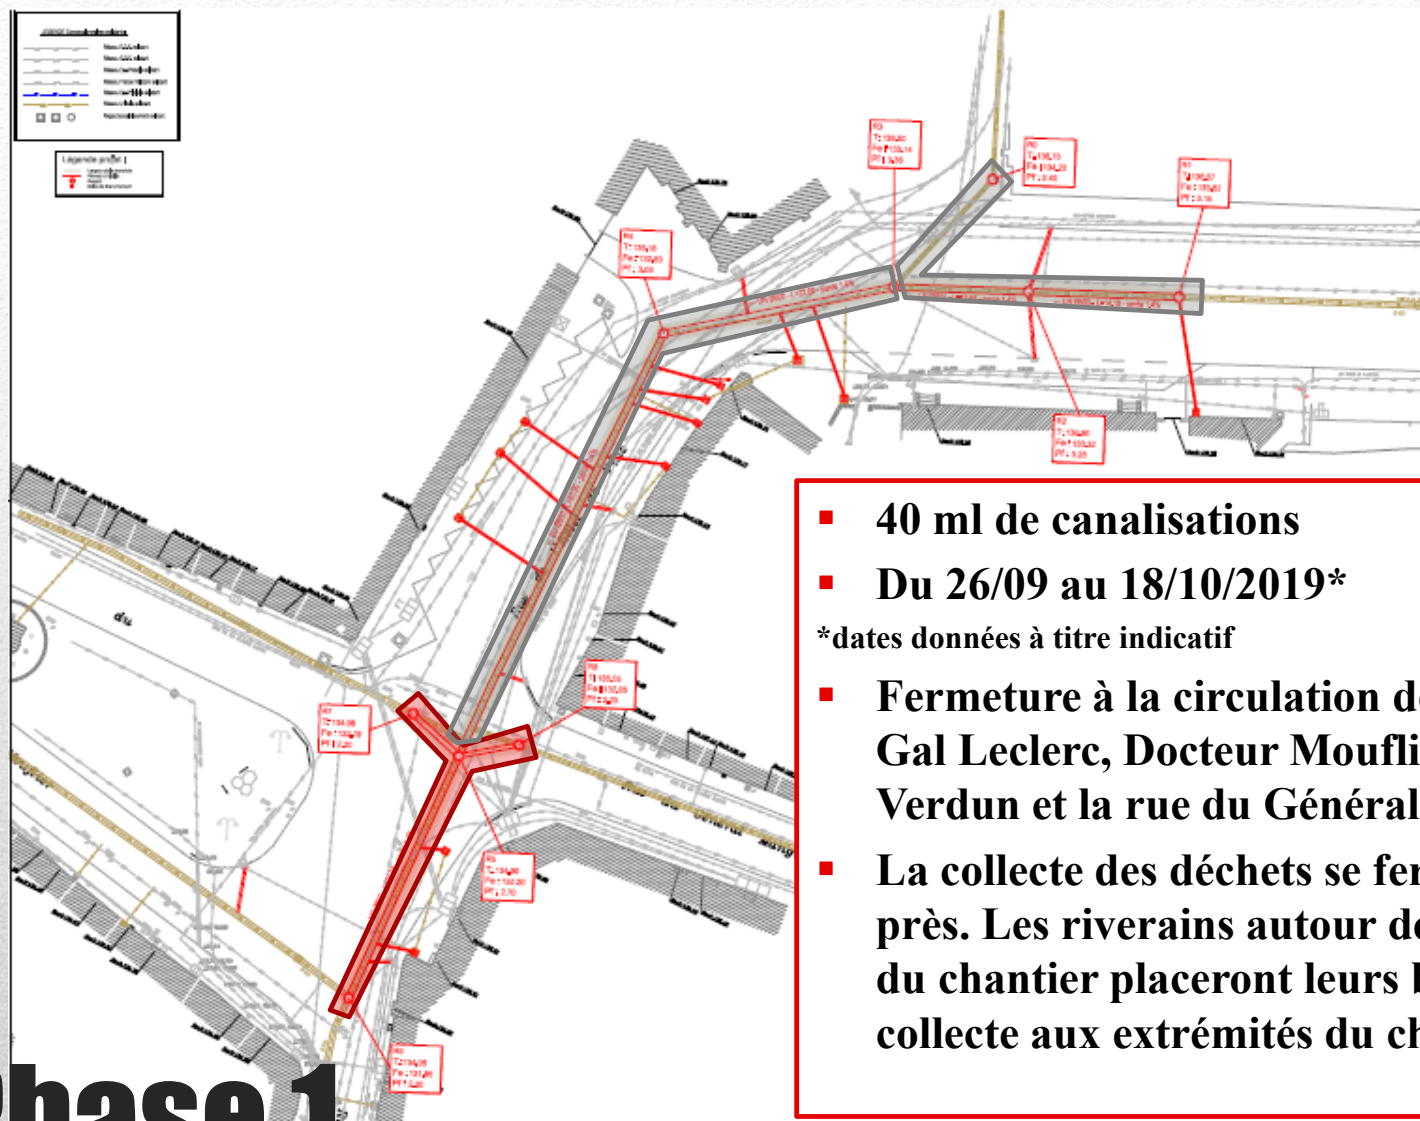

- 40 ml de canalisations
- Du 26/09 au 18/10/2019*
- *dates données à titre indicatif
- Fermeture à la circulation des rues Gal Leclerc, Docteur Mouffler, Verdun et la rue du Général Mangin
- La collecte des déchets se fera au plus près. Les riverains autour de la zone du chantier placeront leurs bacs de collecte aux extrémités du chantier

Phase 1

Déviation phase N°1



Phase 1




Zone travaux




Déviation



Déviation

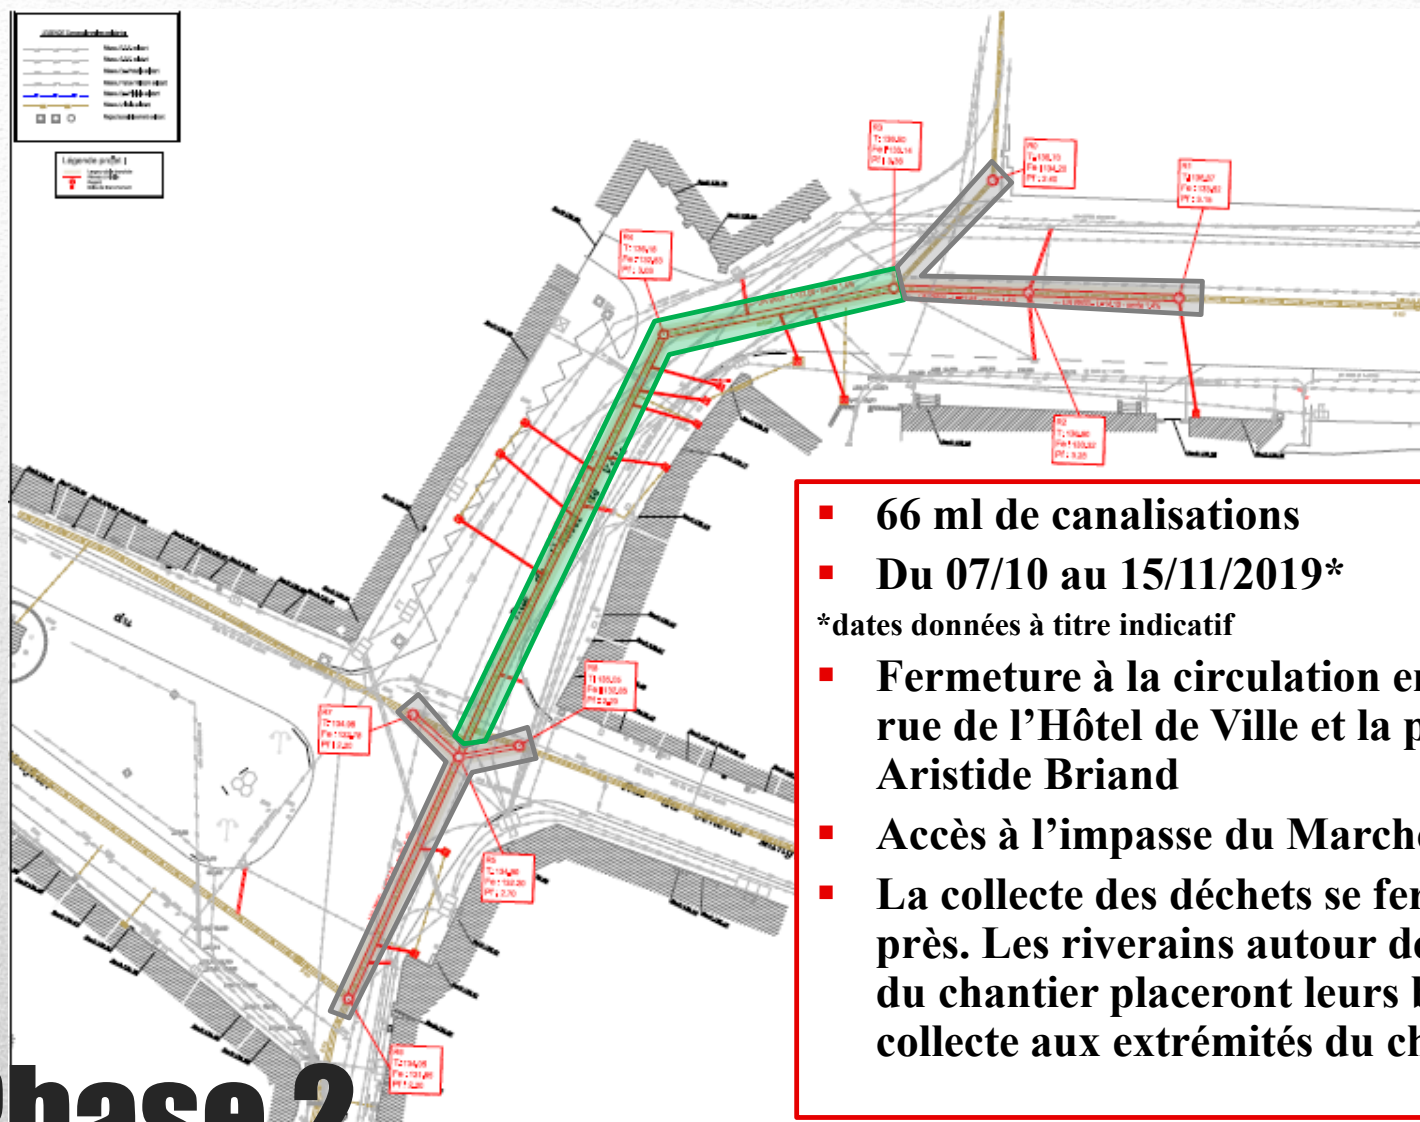

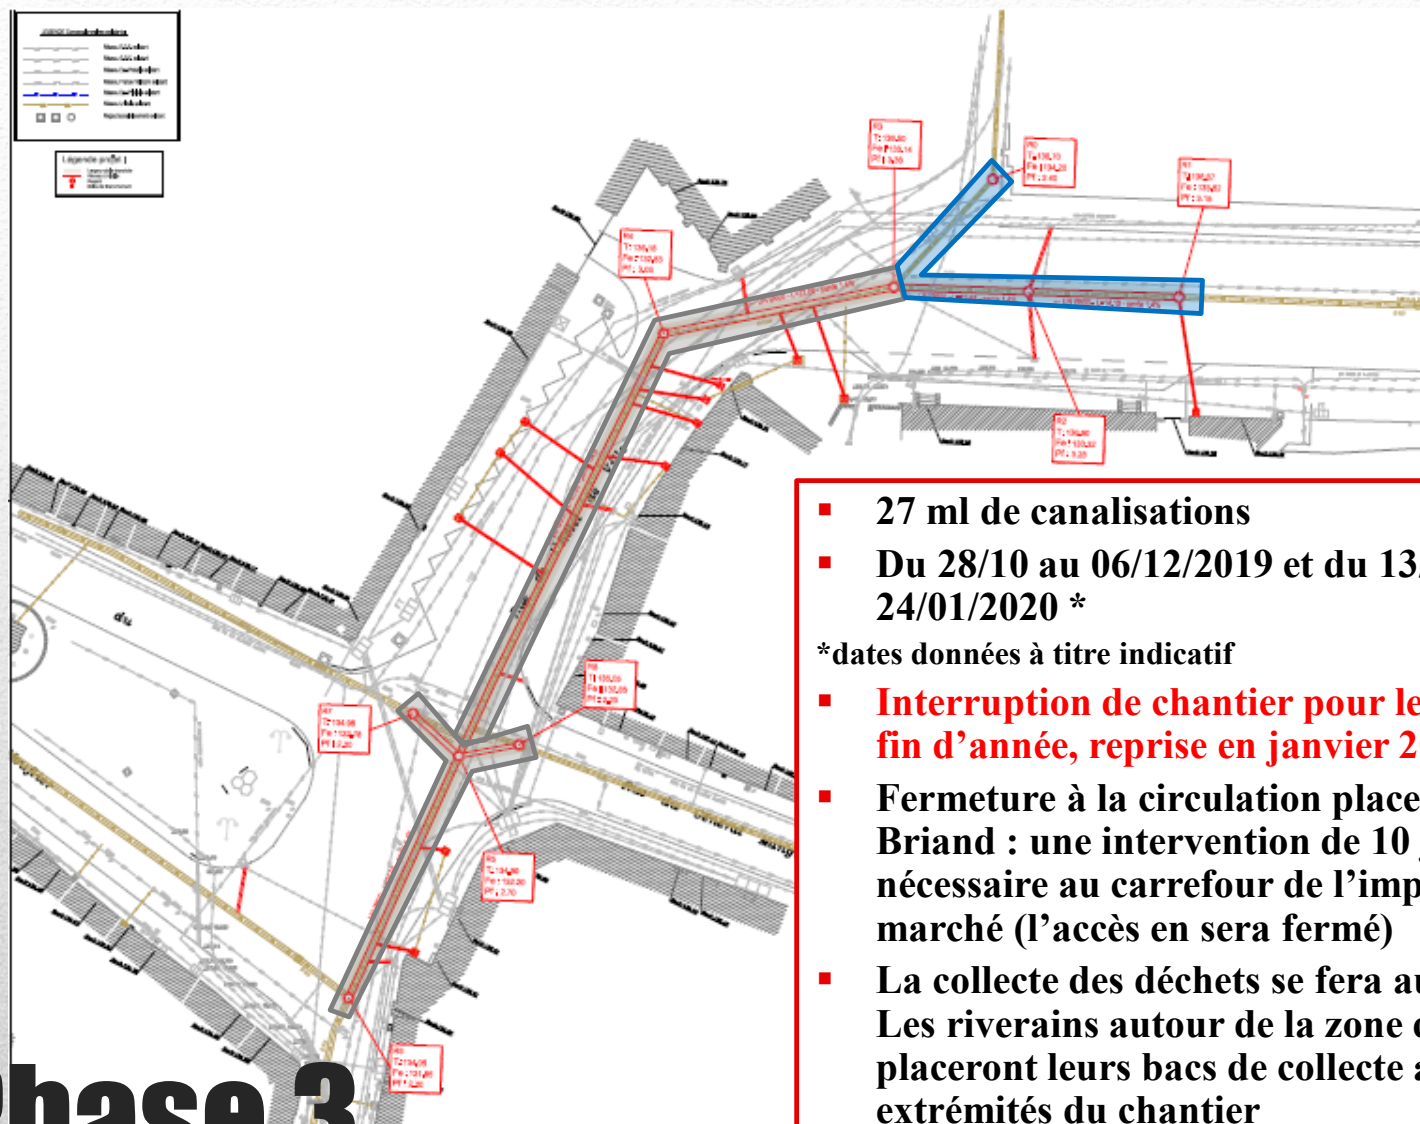

Phase 3

- 27 ml de canalisations
- Du 28/10 au 06/12/2019 et du 13/01 au 24/01/2020 *
- *dates données à titre indicatif
- **Interruption de chantier pour les fêtes de fin d'année, reprise en janvier 2020**
- Fermeture à la circulation place Aristide Briand : une intervention de 10 jours sera nécessaire au carrefour de l'impasse du marché (l'accès en sera fermé)
- La collecte des déchets se fera au plus près. Les riverains autour de la zone du chantier placeront leurs bacs de collecte aux extrémités du chantier

**LES COMMERCES
RESTENT OUVERTS
PENDANT LES
TRAVAUX**

**LES COMMERCES
RESTENT OUVERTS
PENDANT LES
TRAVAUX**

PIETONS

**Accès aux
Commerces**

PIETONS

**Accès aux
Commerces**

**LES COMMERCES
RESTENT OUVERTS
PENDANT LES
TRAVAUX**

Plan de circulation piétonne

Phase préparatoire

- **Pour le bon déroulement de ce chantier, une phase préparatoire est nécessaire.**
 - **Des sondages seront effectués sur l'ensemble de la zone de chantier**
 - **Ces opérations se dérouleront du 16/09 au 18/09 puis du 20/09 au 25/09**
 - **Durant cette phase préparatoire, la circulation sera d'abord fermée sur toute la zone de travaux, puis réouverte au fur et à mesure de l'avancement des sondages effectués.**
 - **Le Marché du Jeudi sera maintenu**
-

Informations complémentaires

- **Les livraisons des commerces se feront au plus près**
 - **Les points de ramassage scolaire seront déplacés rue du Grand Bosquet**
 - **Le parking du Grand Bosquet restera ouvert tous les jours**
 - **Les 4 arrêts des navettes Villéo-Retzéo sur le parcours du centre-ville seront remplacés par des arrêts provisoires rue Léveillé et rue Alexandre Dumas**
 - **Le marché se tiendra en centre-ville le jeudi et le dimanche**
-

Merci de votre attention
